


注 文 書

- 1 工 事 番 号 2 0 2 5 0 0 1 7 2 6
- 2 工 事 名 令和7年度 都市計画道路李埤新田線(Ⅱ期)道路改良工事(2工区)
- 3 施 工 地 名 大崎市 古川地域 福浦地内
- 4 工 事 期 限 令和8年3月31日
- 5 添 付 書 類
 - (1) 特 記 仕 様 書
 - (2) 参 考 明 細 書
 - (3) 図 面
- 6 担 当 課 建設部 建設課

位置図

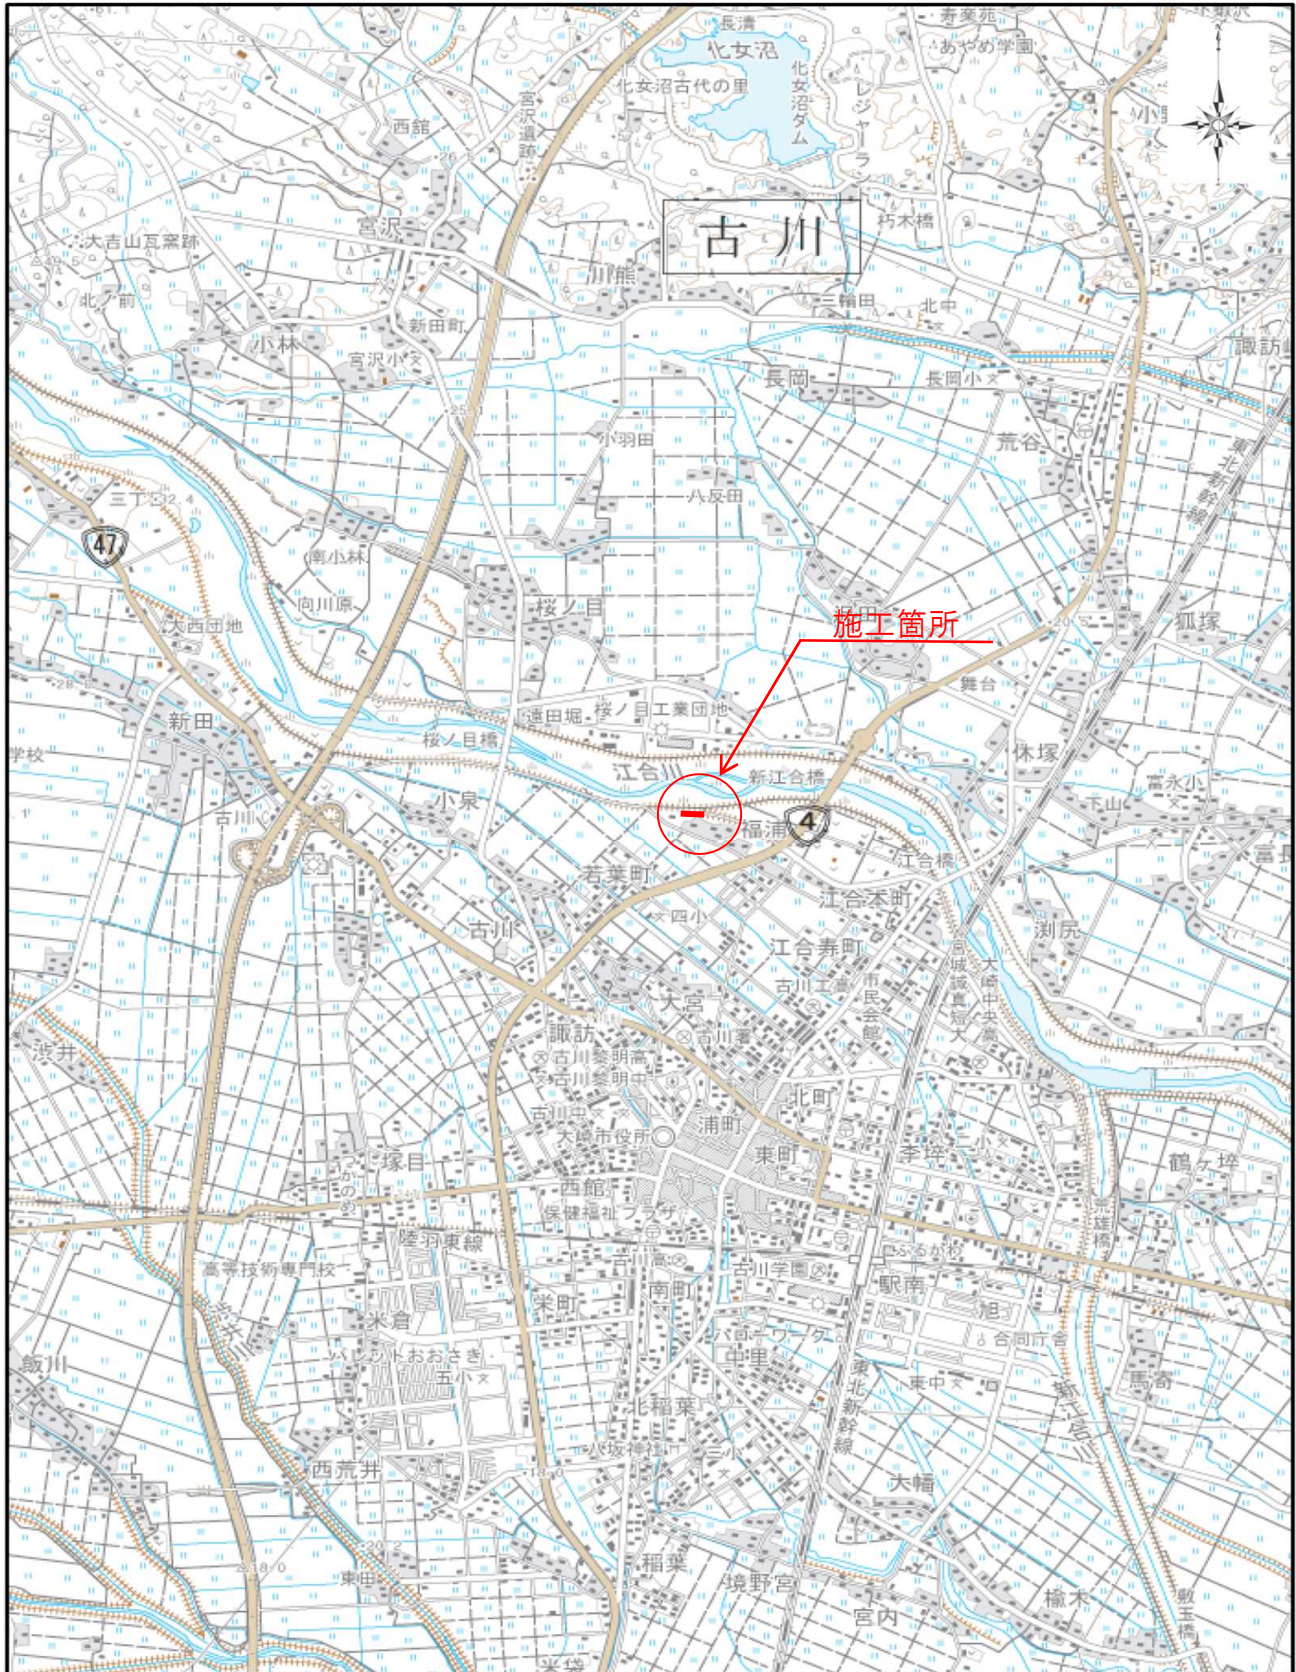

特記仕様書

第1章 総則

1. 本工事はすべて設計図書、宮城県土木工事共通仕様書及び本特記仕様書、施工条件明示書に基づき施工し、また、工事箇所及び周辺にある地上・地下の既設構造物に対し支障を及ぼさないよう事前に占有又は所有者の立ち会いを行い、施工に万全を期すると共に損害を与えた場合は請負者の責任において処置しなければならない。

第2章 材料

1. 工事材料の規格並びに材質は設計図書に明記されたものとし、監督員の承諾を得るものとする。
特に明記なきものについても、同様に監督員の承諾を得たものを使用するものとする。
2. 材料の検査においては、設計図書において明記されたものとするが、特に明記なきものも必要と思われるものについては、監督員と協議するものとする。
3. 材料に関する調査及び見本検査においても前項と同様とする。

第3章 施工

1. 施工に先立ち、施工計画書を監督員に提出し承諾を得るものとする。施工方法については、施工計画書を遵守するとともに現場条件に変化があった場合は、直ちに監督員と協議し施工計画書の変更を行うものとする。
2. 本工事において使用する建設機械は、排出ガス対策型の使用を原則とし、工事箇所において容易に確認できる書類を整備しておくこととする。

第4章 建設副産物処理

1. 本工事において発生する建設副産物については、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」に基づき適正に処理するものとする。
2. 再資源化施設において受入能力等により搬入不可能となった場合は、別の再資源化施設に搬入するものとする。
3. 再資源化施設に搬入不可能となった場合には、建設副産物として「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」に基づき許可を得た処理施設に搬入処理するものとする。
なお、この処理施設以外で自社最終処分場が所定の条件を満たしていると認められる場合は、設計変更の対象とする。ただし、この場合でも処分費は当初設計額における処分費を超えないものとする。
また、自社最終処分場に処理する場合の処分費は、当該最終処分場までの運搬費と最終処分場における廃棄物処理費の合計とする。
4. 当該工事受注後は、速やかに施工計画書の中に再生資源利用計画書・再生資源利用促進計画書及び建設廃棄物処理計画書を作成し提出するものとする。
5. 建設廃棄物を処理したあとは、速やかに建設副産物処理結果報告書に処理状況を確認できる写真及び建設廃棄物処理に係るマニフェスト（積荷目録）を提出するものとする。

第5章 暴力団等の排除について

1. この契約の履行期間中に大崎市入札契約暴力団排除措置規則（平成25年6月1日施行。以下「排除規則」という。）の措置要件に該当すると認められたときは、契約を解除することがある。
2. 本市から指名停止の措置を受けている者にこの契約の全部又は一部を下請けさせ、若しくは受託させてはならない。また、この契約の下請け若しくは受託をさせた者が、排除規則の措置要件に該当すると認められるときは、当該下請契約等の解除を求めることがある。
3. この契約の履行にあたり暴力団員又は暴力団関係者等（以下「暴力団員等」という。）から不当要求又は妨害を受けたときは、速やかに警察への通報を行い、捜査上必要な協力を行うとともに、発注者へ報告すること。また、この契約の下請負若しくは受託をさせた者が、暴力団員等から不当要求又は妨害を受けたときは、同様の措置を行うよう指導すること。
なお、暴力団員等から不当要求又は妨害を受け、適切に警察への通報、捜査協力及び発注

者への報告が行われた場合で、これにより、履行遅延等が発生すると認められるときは、必要に応じて、工程の調整又は履行期限の延長等の措置を講じる。

第6章 その他

1. 本工事に着手するにあたり、必要であれば警察署及び消防署等に道路使用許可申請、通行止めの協議をし、緊急・一般車両・歩行者等の交通に支障のないよう努めること。
2. 本工事において境界杭を破損・紛失した場合は、請負社の責任において復元するものとする。
3. 本工事における下請負、資材調達は大崎市内の企業を活用することを原則とする。
また、工事着手後に発注者が指定した主要資材については、工事完了時に主要資材市内調達調書を提出すること。
4. 本工事の実施にあたり、東北地方太平洋沖地震による被災者等の市内求職者の積極的な雇用に努めること。
5. 本工事は、週休2日工事の対象である。
6. 受注者は、対象期間の開始日から休日等の取得の実績が確認できる休日等取得実績書を作成し、発注者へ提出するものとする。
7. 当初発注においては、補正係数なしで積算しており、「月単位の週休2日」、「完全週休2日」に取り組む場合は、工事着手前に受発注者間で協議の上、週休2日の区分を決定することとする。協議により、「月単位の週休2日」又は「完全週休2日」に取り組み、達成した場合は、積算変更時に達成した区分に応じた週休2日の補正係数に変更する。
8. 工期については、大崎市議会において、本業務に係る歳出予算の繰越等について議会の議決又は承認された場合に限り、延長することができるものとする。
変更完了予定年月日：令和8年6月30日

特記仕様書

令和7年11月1日以降公告案件から適用

施工条件明示書

工事番号	2025001726	工事名	令和7年度 都市計画道路李埴新田線(Ⅱ期)道路改良工事(Ⅱ区)		事務所名	大崎市 建設部 建設課			
項 目		条 件	内 容			施 工 方 法		備 考	
1 共通仕様書の適用		本工事は、宮城県土木部制定「共通仕様書」を適用するほか、本特記仕様書により施工するものとする。 仕様書の記載内容の優先は、「特記仕様書」「共通特記仕様書」「共通仕様書」の順とする。							
2 主任技術者及び監理技術者(以下、配置技術者という。)の配置									
(1) 現場施工に着手する日の指定 (配置技術者の配置要件の特例) ※平成25年4月1日以降適用「現場施工の着手日を指定した工事における配置技術者の配置要件の特例について」		○	契約工期初日以降、90日以内に着手 (手持ち工事が完了した場合や、制約条件がない場合等は、期日以前の着手も可能)						
(2) 請負者が着手日を選択出来る工事(フレックス工事)		○	契約工期初日以降、○日以内に着手 土木工事共通特記仕様書第1編1-1-4によること。						
(3) 上記以外		●	請負者は、現場施工に着手する日の指定がない限り、原則として、契約工期初日以降、30日以内に現場施工に着手						
上記現場施工に着手する日の前日までの期間において、工事準備等を含め工事現場が不稼働であることが明確な場合は、配置技術者の工事現場への専任は要しない。 出納局契約課ホームページ参照のこと。http://www.pref.miyagi.jp/soshiki/keiyaku/kk50.html									
3 専任特例の適用を受ける技術者の配置									
		建設業法第26条第3項ただし書の規程(以下「専任特例」という。)の適用を受ける主任技術者又は監理技術者を配置する場合は、下記によるものとする。 1 専任特例の適用を受ける主任技術者又は監理技術者を配置する場合、適用要件について以下の出納局契約課ホームページを参照すること。 https://www.pref.miyagi.jp/soshiki/keiyaku/kk50.html 2 本工事の主任技術者又は監理技術者が専任特例の適用を受ける場合、落札候補者となった際に確認事項兼誓約書を提出すること。 3 本工事において、専任特例の適用を受ける主任技術者又は監理技術者の配置を行う場合は配置を要さなくなった場合は適切にコリンズ(CORIINS)への登録を行うこと。							
4 積算基準及び設計単価の適用期日									
(1) 積算基準及び設計単価の適用について		●ある	○ない	積算基準及び設計単価は公告日の前月の基準及び単価としている。					
(2) 工事請負契約締結後における設計単価の変更		○ある	●ない	本工事は、当初工事請負契約締結後において、契約日を基準日として設計単価の設計変更を行うこととする。 なお、設計変更の対象は、資材単価・労務単価及び機械単価等の全ての設計単価とする。 ただし、災害に伴う応急仮工事など緊急を要す工事において、積算月と契約月が同月となる場合など、工事請負契約締結後における設計単価の変更が必要ないと判断される場合においては、適用「なし」を選択することも可能とし、その場合は下欄にその理由を記載する。					
				適用「なし」の理由	・本工事の設計変更の対象は、設計変更時の追加工種のみとするため。				
5 工程関係									
(1) 関連工事による施工時期の調整		●ある	○ない	隣接する工事(令和7年度都市計画道路李埴新田線(Ⅱ期)道路改良工事)との施工時期調整が必要である。					
(2) 施工時期による制限		○ある	●ない						
(3) 関係機関等との協議の未成立		●ある	○ない	河川法55条の協議が必要である。					
(4) 関係機関等との協議結果、特定条件の付加		○ある	●ない						
6 公害対策関係									
(1) 施工方法、機械施設、作業時間等の制限		●ある	○ない	工事設計額の算出に際し、機械経費については、「低騒音型・低振動型建設機械」として指定された機種を使用している。		関係法令及び条例で定められた基準に従って実施すること。			
7 安全対策関係									
(1) 交通安全施設等の指定		○ある	●ない						
(2) 占用埋設物との近接工事による 施工方法、作業時間の制限		○ある	●ない						
8 排水工関係									
(1) 濁水、湧水処理のための特別な対策の必要性		○ある	●ない						
9 建設副産物対策関係(建設発生土)									
(1) 建設発生土の処理・処分について		本工事の残土は、下記に運搬するものとする。なお、下記により難い場合が生じたときは、監督職員の指示によるものとし、設計変更の対象とする。							
				処理・処分する場所		処理・処分方法	距 離	制 限 時 間	備 考
				名称	所在地				
(2) 建設発生土	処理・処分	●ある	○ない	有限会社久光組	大崎市鹿島台 広長石川原	残土処分	19.5km以下		

10 建設副産物対策関係(建設発生土以外の建設副産物)										
(1) 建設発生土以外の建設副産物の処理・処分について			下記の処理・処分は設計積算上の条件明示であり、処理施設を指定するものではない。なお、下記によらない場合は、監督職員と協議すること。また、処理・処分に先立ち処分場等の受入れの可否を確認すること。なお、廃棄物の処理に当たっては「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」を遵守すること(環境省または循環型社会推進課のHPを参照)。							
			処理・処分する場所		処理・処分方法		距 離		制 限 時 間	
			工事現場内及び工事現場間で再利用する場合は、施工管理及び契約方法等について、施工計画打合せ時に監督職員と協議すること。							
(2) 建設発生土以外の建設副産物	処理・処分	コンクリート塊	○ある	●ない					時 分 ～ 分	
		アスファルト塊	○ある	●ない					時 分 ～ 分	
		建設発生木材	○ある	●ない			km		時 分 ～ 分	
		建設汚泥	○ある	●ない			km		時 分 ～ 分	
		その他	○ある	●ない			km		時 分 ～ 分	
(3) 再生材の利用			●ある	○ない	種類・数量		再生クラッシャーランRC-40			
11 現場環境改善			○ある	●ない	内容					
12 品質証明										
(1) 品質証明書および施工プロセス品質確認チェックリストの対象			○ある	●ない	請負工事費が、1億5千万円以上の工事および発注者が必要と認める工事。 土木工事共通特記仕様書第3編1-1-9および品質証明実施要領によること。					
(2) 施工プロセス品質確認チェックリストの対象			○ある	●ない	上記に該当せず、請負工事費が1億円以上の工事。 土木工事共通特記仕様書第3編1-1-9および品質証明実施要領によること。					
13 標準的な設計図書による発注方式			○ある	●ない	土木工事共通特記仕様書第3編1-1-14によること。					
14 資材関係										
(1) 生コンクリート			生コンクリートの使用に当たっては、「宮城県生コンクリート品質管理監査会議」が交付する「品質管理監査合格証」を有する工場の製品、又は同等以上の品質管理を行っていることが認められる工場の製品を使用すること。							
(2) 購入土			購入土を使用する場合は、材料承諾時に「採石法第33条による採取計画認可書の写し」、又は「砂利採取法第16条の採取計画認可書の写し」を提出すること。							
(3) 宮城県グリーン製品の利用 「宮城県グリーン製品」利用推進指針によること。「宮城県グリーン製品」を使用した場合は、請負者は循環型社会推進課HPより「チェックリスト」をダウンロードし、使用材料や数量等を入力後、工事完了後に監督職員に提出(電子メール)すること。			必須	1. 植生基盤材等、視線誘導標、型枠用合板は、原則として宮城県グリーン製品を用いること。						
			○ある	●ない	2. 盛土材、埋め戻し材					
			○ある	●ない	3. その他()					
(4) 県内産製品の使用			○ある	●ない	本工事は、「県土木部発注工事における県内産製品優先使用の試行要領」の対象工事である。 工事の施工にあたっては、試行要領に基づき適切に実施すること。 事業管理課ホームページ参照 http://www.pref.miyagi.jp/soshiki/jigyokanri/kensanzai.html					
(5) 現場吹付法枠工			吹付モルタルにおける圧縮強度の規格値は、18N/mm2以上とする。							
15 設計変更の手続き										
(1) 設計変更の手続きについて			設計変更については、工事請負契約書第19条～第26条及び共通仕様書第1編1-1-1-14～1-1-1-16に記載しているところであるが、その具体的な考え方や手続きについては、「工事請負契約における設計変更ガイドライン」(宮城県土木部)によることとする。							
			詳細については、以下のホームページ「設計変更ガイドライン【土木工事,建設関連業務】」を参考とすること。 https://www.pref.miyagi.jp/soshiki/jigyokanri/henkou-guideline.html トップページ > しごと・産業 > 土木・建築・不動産業 > 建設業 > 設計変更ガイドライン【土木工事,建設関連業務】							
16 その他										
(1) 舗装の下請制限について			○ある	●ない	土木工事共通特記仕様書第1編1-1-3によること。					
(2) 「ダンプ土砂運搬等下請を行う工事における工事費内訳調査」の対象の有無			○ある	●ない	本工事は「ダンプ土砂運搬等下請を行う工事における工事費内訳調査」の対象工事であり、請負者は、調査票等に必要事項を正確に記入し発注者に提出する他、ダンプ土砂運搬等下請負契約に関する関係書類を提出すること。 請負者が本工事の一部について下請契約を締結する場合には、請負者は、当該工事の受注者(当該下請工事の一部に係る二次以降の下請負人を含む)も同様の義務を負う旨を周知すること。					
(3) 三者会議の対象の有無			○ある	●ない	本工事は、工事着手前等に当該工事の発注者、施工者、詳細設計等を担当した設計者が参加して、設計図書と現場の整合性の確認及び設計意図の伝達等を行う「三者会議」を設置する対象工事である。 土木工事共通特記仕様書第3編1-1-5によること。					
(4) 貸与資料の有無			○ある	●ない	本仕様書によるもののほか工事施工に關して必要な資料として工事契約後下記の資料を貸与する。 貸与資料()					
(5) 発注者支援(工事監督支援業務)対象の有無			○ある	●ない	工事監督支援業務の受注者が現場監督支援する場合、工事請負者対し「工事打合せ簿」により担当技術者(所属会社等名・氏名)の通知を行うこと。					
(6) 法定外の労災保険の付保について			本工事では、法定外の労災保険加入にかかる保険料を予定価格に反映しているため、本工事において受注者は法定外の労災保険に付さなければならない。なお、加入後受注者は、工事請負契約書第62条に基づき、証券又はこれに代わるものを直ちに発注者に提示すること。							
(7) 熱中症対策に資する現場管理費補正の試行の有無			●ある	○ない	本工事は熱中症対策に資する現場管理費率の補正の試行対象工事である。本運用による設計変更を希望する場合は、別途定める「熱中症対策に資する現場管理費補正の試行要領」に基づき、発注者に協議すること。					

働き方改革・生産性向上に関する事項

項 目	条 件	内 容
17 総合評価落札方式における「ICT施工・3次元化等の活用提案」の適用の有無		
(1)「ICT施工・3次元化等の活用提案」の適用工事	○対象 ●対象外	1. 対象工事の場合、活用する技術については、「ICT施工・3次元化等の活用提案 工事計画書」に基づき選択すること。 2. ICT施工・3次元化等の活用提案の適用の有無に係わらず、「ICT施工・3次元化等の活用提案 工事計画書」に記載の技術は、施工計画・技術提案等(いわゆる作文)の評価対象外とする。(「簡易型(施工計画型)」、「標準型」、「高度型」の場合) なお、「ICT施工・3次元化等の活用提案」の対象外工事の場合も、同様の取扱いとする。
(2)実施された技術についての費用計上(設計変更)	○対象 ●対象外	設計変更の積算手法については、総合評価落札方式の手引きのとおりとする。なお、(1)が対象外の場合は、当該項目も対象外となる。
18 業務効率化		
(1)工事情報共有システムの活用	○対象 ●対象外	本工事は工事情報共有システムの活用対象工事であり、請負者は工事着手時に別途定める「工事情報共有システム事前協議チェックシート」により、必要事項について監督職員と協議を行うこと。実施にあたっては「宮城県土木部における工事情報共有システムの実施要領」及び「土木工事における工事情報共有システムの活用ガイドライン」に基づき行うこと。
(2)工事書類の簡素化の試行について	○あり ●なし	本工事は、工事書類の簡素化を目的とした試行対象工事である。実施にあたっては「宮城県土木部における工事書類簡素化の試行要領」に基づき行うこと。
(3)ウィークリースタンス等の推進		本工事は、受発注者協力のもと、建設業の魅力創出を図ることを目的にウィークリースタンス等の推進を図ることとし、「ウィークリースタンス等実施要領」に基づき、取組内容を受発注者間で協議及び共有し、工事を進めていくこととする。 詳細については、宮城県土木部事業管理課のホームページを参照すること。(http://www.pref.miyagi.jp/soshiki/jigyokanri/weekly.html)
19 週休2日工事の適用の有無		
(1)週休2日工事	●対象 ○実施困難工事	1. 週休2日対象工事の場合は、宮城県土木部「週休2日工事」実施要領に基づき、行うこととする。 なお、週休2日工事の種別及び区分については、下記(2)、「(3)」のとおりとする。 2. 改正労働基準法(平成30年6月成立)による罰則付きの時間外労働規制が建設業に適用されたことを踏まえ、週休2日の確保を目指し、「週休2日工事」での発注を原則とする。ただし、応急復旧工事など緊急工事の場合は、例外的に週休2日対象工事としないことも可能とする。その場合は「実施困難工事」として、下欄にその理由を記載する。
(2)週休2日工事の種別	<input checked="" type="checkbox"/> 現場閉所型 <input type="checkbox"/> 交替制	現場閉所型:巡回パトロールや保守点検等、現場管理上必要な作業を行う場合を除き、現場事務所での事務作業を含めて、1日を通して現場や現場事務所を閉所する。 交 替 制 :現場閉所を行うことが困難な工事について、技術者及び技能労働者が交替しながら休日確保の取組を行う。
(3)週休2日工事の区分		当初発注においては、補正係数なしで積算しており、「月単位の週休2日」、「完全週休2日」に取り組む場合は、工事着手前に受発注者間で協議の上、週休2日の区分を決定することとする。 協議により、「月単位の週休2日」又は「完全週休2日」に取り組む、達成した場合は、積算変更時に達成した区分に応じた週休2日の補正係数に変更する。
20 女性活躍推進モデル工事の適用の有無		
(1)女性活躍推進モデル工事	○対象 ●対象外	実施にあたっては、宮城県土木部「女性活躍推進モデル工事」実施要領に基づき行うものとする。 実施要領は、宮城県ホームページ(https://www.pref.miyagi.jp/soshiki/jigyokanri/)で確認のこと。
21 下請承認事務簡素化モデル工事の適用の有無		
(1)下請承認事務簡素化モデル工事	○対象 ●対象外	実施にあたっては、発注者から工事打合せ簿により、「下請承認事務簡素化モデル工事」である旨を別途指示するものとする。

東日本大震災に伴う特例制度

項 目	条 件	内 容	施 行 方 法	備 考
22 被災地以外からの労働者確保に要する間接費の設計変更の運用				
(1) 労働者確保に関する積算方法の試行工事	○ある	●ない	<p>1 本工事は、「共通仮設費(率分)のうち営繕費」及び「現場管理費のうち労務管理費」の下記に示す費用(以下「実績変更対象間接費」という。))について、契約締結後、労働者確保に要する方策に変更が生じ、宮城県土木部においては土木工事標準積算基準(宮城県土木部)に基づく金額相当では適正な工事の実施が困難になった場合は、実績変更対象間接費の支出実績を踏まえて最終精算変更時点で設計変更する「労働者確保に関する積算方法の工事」である。</p> <p>営繕費:労働者送迎費、宿泊費、借上費 労務管理費:募集及び解散に要する費用、賃金以外の食事、通勤等に要する費用</p> <p>2 本工事の予定価格の算出の基礎とした設計額(宮城県土木部においては、土木工事標準積算基準に基づき算出した額)における実績変更対象間接費の割合は次のとおりである。</p> <p>1) 共通仮設費(率分)に占める実績変更対象間接費(労働者送迎費、宿泊費、借上費)の割合: 12.82% 2) 現場管理費に占める実績変更対象間接費(募集及び解散に要する費用、賃金以外の食事、通勤等に要する費用)の割合: 1.52%</p> <p>3 受注者は、実績変更対象間接費の支出実績を踏まえて設計変更を希望する場合は、実績変更対象間接費に係る費用の内訳を記載した「労働者確保に係る実績報告書(様式1)」及び実績変更対象間接費について実際に支払った全ての証明書類(領収書、領収書の出ないものは金額の適切性を証明する金額計算書など。)を監督員に提出し、設計変更の内容について協議するものとする。</p> <p>4 受注者の責めによる工事工程の遅れ等受注者の責めに帰すべき事由による増加費用については、設計変更の対象としない。</p> <p>5 発注者は、実績変更対象間接費の支出実績を踏まえて設計変更する場合、受注者が実績変更対象間接費について実際に支払った額のうち証明書類において確認された費用から、宮城県土木部においては土木工事標準積算基準(宮城県土木部)に基づき算出した額における実績変更対象間接費を差し引いた費用を加算して算出する。なお、全ての証明書類の提出がない場合であっても、提出された証明書類をもって設計変更を行うものとする。</p> <p>6 受注者から提出された資料に虚偽の申告があった場合については、法的措置及び入札参加資格制限等の措置を行う場合がある。</p> <p>7 受注者は、実績変更対象間接費にかかる設計変更について疑義が生じた場合は、監督員と協議するものとする。</p>	
(2) 労働者宿舍設置に関する積算方法の試行工事	○ある	●ない	本工事は、「労働者宿舍設置に関する試行要領」(以下試行要領)の対象工事である。 労働者宿舍の設置を希望する場合については、「試行要領」に基づき監督職員と事前に協議すること。	
23 遠隔地からの建設資材調達に係る設計変更				
(1) 遠隔地からの建設資材調達に係る設計変更	○ある	●ない	<p>下記の建設資材は、通常地域内から調達することを想定しているが、安定的な確保を図るために、当該調達地域以外から調達せざるを得ない場合には、事前に監督職員と協議するものとする。また、購入費及び輸送費に要した費用については、証明書類(契約書及び納品書等)を添付するものとする。なお、添付する証明書類(契約書及び納品書等)は原本を提示(写しの提出)とし、受注者名、納品者名、使用資材名、規格・形状、使用(納品)日、使用(納品)数量等が記載されている物を監督員に提出し、その費用について設計変更することとする。</p> <p>購入費の対象は、生コンクリート・アスファルト合材・石材等(山砂、碎石、捨石、被覆石等)とする。 輸送費の対象は、仮設材(鋼矢板等)とする。</p> <p>受注者は、購入費及び輸送費を変更したい場合は、「工事打合せ簿」に次の事項を記載し発注者に提出し協議するものとする。 1 地域内及び基地に、建設資材がないことを証明する資料(打合せメモ等) 2 遠隔地から購入及び輸送する建設資材の名称・規格及び製造・生産工場の名称(使用材料の建設資材名及び規格・形状等の証明資料「品質証明」) 3 遠隔地から建設資材を購入及び輸送する理由 4 製造・生産工場を選定した理由 5 見積り書 6 その他、必要と思われる事項</p>	
24 施工箇所が点在する工事の間接費の積算				
(1) 施工箇所が点在する工事積算方法の試行の対象工事	○ある	●ない	<p>本工事は、施工箇所が点在する工事であり、共通仮設費及び現場管理費について標準積算と施工実施に乖離が考えられるため、「○○地区(施工箇所○○、○○)、△△地区(施工箇所○○)、□□地区(施工箇所○○)(以下、対象地区という)」ごとに共通仮設費及び現場管理費を算出する「施工箇所が点在する工事積算方法の試行」の対象工事である。</p> <p>本工事における共通仮設費の金額は、対象地区毎に算出した共通仮設費を合計した金額とする。また、現場管理費の金額も同様に、対象地区毎に算出した現場管理費を合計した金額とする。なお、共通仮設費率及び現場管理費率の補正(大都市、施工地域等)については、対象地区毎に設定する。</p>	
25 その他				
(1) 土砂等建設資材を供給元で引取する場合の積算の取扱	○ある	●ない	<p>・本工事の施工において、調達(購入)する予定の○○の設計単価は、現場持込価格(単価)としている。ただし、契約後、施工計画に基づき、○○の調達条件について異なる場合は、監督職員と協議すること。 ・資材搬入において、標準作業以外の作業(現場外の仮置き等)が生じる場合は、監督職員と協議すること。</p>	
(2) 東日本大震災の復旧・復興事業等における積算方法等に関する試行について	●ある	○ない	<p>間接工事費(共通仮設費及び現場管理費)について、工事量の増大による資材やダンプトラック等の不足による作業効率の低下等により現場の実支出が増大し、積算基準による積算と乖離が生じていることが確認されたため、積算基準書等により各工種区分に従って対象額ごとに求めた共通仮設費率及び現場管理費率に、それぞれ以下の補正係数を乗じている。</p> <p>補正係数 共通仮設費:1.3 現場管理費:1.1</p>	

特記事項

1 追加事項1			
(1) 設計図書と現地調査の相違点について	着手前調査において、本設計図書との相違点が確認された場合は、直ちに監督職員に報告するとともに、対応を検討し書面で協議すること。		
(2) 提出書類について	工事打合せ簿や段階確認書等の提出書類については、遅滞なく監督職員に提出し、承諾後次の施工に移行すること。なお、履行報告書には、各工種の進捗率が分かるように整理することとし、施工写真を必ず添付すること。		
(3) 週間工程表について	施工に際し、2週間工程表を前週中に提出すること。提出方法については電子メールとする。		
(4) 苦情等の対応について	施工に際して、利用者及び地域住民に迷惑のかかることのないように十分注意をおこなうこと。また、本工事において、疑義や一般の方から苦情があった場合は、速やかに監督員に報告し、協議または打ち合わせをおこなうこと。		
(5) 工事実績情報システム(コリンズ)	請負者は、工事請負額が500万円以上の工事について、工事実績サービス(CORINS)に基づき、受注・変更・訂正時に工事実績情報として「工事カルテ」を作成し登録申請を行うこと。		
2 追加事項2			
(1) その他	本設計仕様等で疑義が生じた場合は直ちに監督職員と協議するものとし、打合せ・協議・承諾・指示等の内容はすべて工事打合せ簿等の書面で行うこと。		
(2) 追加			
(3) 追加			
(4) 追加			
(5) 追加			
3 追加事項3			
(1) 追加			
(2) 追加			
(3) 追加			
(4) 追加			
(5) 追加			
4 追加事項4			
(1) 追加			
(2) 追加			
(3) 追加			
(4) 追加			
(5) 追加			
5 追加事項5			
(1) 追加			
(2) 追加			
(3) 追加			
(4) 追加			
(5) 追加			
6 追加事項6			
(1) 追加			
(2) 追加			
(3) 追加			
(4) 追加			
(5) 追加			
7 追加事項7			
(1) 追加			
(2) 追加			
(3) 追加			
(4) 追加			
(5) 追加			

設計単価リスト

別 紙

工事名 令和7年度 都市計画道路李埵新田線（Ⅱ期）道路改良工事（2工区）

名 称	規 格	単位	単価	年度	月	単価採用元	備 考
タイヤローラー [普通型]	運転質量13～14t	日		2025	12	物価資料	積算資料，建設物価を比較し，最低価格の積算資料掲載単価採用 ※長期割引適用
生コンクリート	18-8-40-60%	m ³		2025	12	宮城県資料	宮城県土木部単価
フィルター材料	山砂（不洗）	m ³		2025	12	宮城県資料	宮城県土木部単価
歩車道境界ブロック	C-180/240X300X2000	個		2025	12	宮城県資料	宮城県土木部単価
側溝	L型側溝 LS3-1 L=2000（一般部）	枚		2025	12	見積資料	3者見積り，最低価格採用
側溝	L型側溝 LS3-1 L=2000（乗入部）	枚		2025	12	見積資料	3者見積り，最低価格採用
側溝	自由勾配側溝 300×400×2000	個		2025	12	宮城県資料	宮城県土木部単価
側溝	自由勾配側溝 300×500×2000	個		2025	12	宮城県資料	宮城県土木部単価
側溝	ME暗渠 タイプB 300X300X2000	個		2025	12	物価資料	建設物価
側溝蓋	Co製 300型 軽荷重用	枚		2025	12	宮城県資料	宮城県土木部単価
側溝蓋	Gr製細目 300型 軽荷重用	枚		2025	12	見積資料	3者見積り，最低価格採用
集水枳	路面集水枳 600×600×H330/410	個		2025	12	見積資料	3者見積り，最低価格採用
固化材	一般軟弱土用	t		2025	12	物価資料	積算資料，建設物価を比較し，最低価格の建設物価掲載単価採用
六価クロム溶出試験		検体		2025	12	宮城県資料	宮城県土木部単価
室内CBR試験		箇所		2025	12	物価資料	積算資料，建設物価を比較し，最低価格の建設物価掲載単価採用
締め固めた土のCBR試験		試料		2025	12	宮城県資料	宮城県土木部単価

【参考資料】

※本工事工種は「道路改良工事」である。

※施工地域補正「補正無し」である。

※復興係数補正「あり」である。

※技術管理費の積上げ項目（諸経费率対象の場合☒ 非対象の場合☐）

・ 室内 CBR 用試料採取（諸経费率対象 現場管理費 ☒ 一般管理費 ☒ ）

・ 締め固めた土の CBR 試験（諸経费率対象 現場管理費 ☒ 一般管理費 ☒ ）

・ 六価クロム溶出試験（諸経费率対象 現場管理費 ☐ 一般管理費 ☐ ）

設計内訳書（本01）

工事名	都市計画道路李埤新田線(Ⅱ期)道路改良工事 (2工区)				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
道路改良								
			式	1				
道路土工								
			式	1				
掘削工								
			式	1				
掘削		土質:土砂,施工方法:オープンカット,押土:無し,障害:無し,施工数量:5,000m3未満						単 1号
			m3	620				
残土処理工								
			式	1				
土砂等運搬		土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)						単 2号
			m3	620				
残土等処分								単 3号
			m3	620				
地盤改良工								
			式	1				
路床安定処理工								
			式	1				
安定処理		混合深さ:0.6m以下,固化材100m2あたり使用量:7.33t/100m2,固化材の種類:一般軟弱土用						単 4号
			m2	536				
排水構造物工								
			式	1				
作業土工								
			式	1				
床掘り		土質:土砂						単 5号
			m3	20				

設計内訳書（本01）

工事名	都市計画道路李埤新田線（Ⅱ期）道路改良工事（2工区）				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
埋戻し		土質:土砂						単 6号
			m3	10				
側溝工								
			式	1				
自由勾配側溝		側溝規格:300X400						単 7号
			m	25.7				
自由勾配側溝		側溝規格:300X500						単 8号
			m	13.5				
側溝蓋		Co製 軽荷重用						単 9号
			枚	16				
側溝蓋		鋼製Gr製細目 軽荷重用						単 10号
			枚	3				
集水柵・マンホール工								
			式	1				
プレキャスト街渠柵		柵規格:路面排水柵						単 11号
			箇所	3				
舗装								
			式	1				
舗装工								
			式	1				
アスファルト舗装工								
			式	1				
下層路盤(車道・路肩部)		路盤材種類:再生ｸﾞﾗｯｼｬﾝ RC-40、仕上り厚:710mm						単 12号
			m2	495				
下層路盤(歩道部)		路盤材種類:再生ｸﾞﾗｯｼｬﾝ RC-40、仕上り厚:100mm						単 13号
			m2	351				

設計内訳書（本01）

工事名	都市計画道路李埤新田線（Ⅱ期）道路改良工事（2工区）				事業区分 工事区分	道路新設・改築 舗装	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
下層路盤(歩道部)	路盤材種類:再生アスファルト RC-40, 仕上り厚:250mm						単 14号
		m2	34				
透水性舗装工							
		式	1				
フィルター層	材料種類:砂, 仕上り厚:50mm						単 15号
		m2	351				
排水構造物工							
		式	1				
側溝工							
		式	1				
管(函)渠型側溝	幅:30cm, 高さ:30cm						単 16号
		m	70				
プレキャストU型側溝	U型側溝規格:L型側溝（一般部）LS3-1 L=2000						単 17号
		m	28				
プレキャストU型側溝	U型側溝規格:L型側溝（乗入部）LS3-1 L=2000						単 18号
		m	12				
縁石工							
		式	1				
縁石工							
		式	1				
歩車道境界ブロック	ブロック規格:C-180/240X300X2000						単 19号
		m	70				
直接工事費							
		式	1				
共通仮設							
		式	1				

- 3 -

大崎市

設計内訳書（本01）

工事名	都市計画道路李埤新田線（Ⅱ期）道路改良工事（2工区）				事業区分 工事区分	道路新設・改築 舗装	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
共通仮設費							
		式	1				
運搬費							
		式	1				
建設機械運搬費							単 20号
		台	2				
技術管理費							
		式	1				
CBR試験							単 21号 諸経費率対象
		試料	3				
六価クロム溶出試験							単 22号 諸経費率対象外
		検体	1				
共通仮設費（率計上）							
		式	1				
純工事費							
		式	1				
現場管理費							
		式	1				
工事原価							
		式	1				
一般管理費等							
		式	1				
工事価格							
		式	1				
消費税額及び地方消費税額							
		式	1				

- 4 -

大崎市

設計内訳書 (本01)

[illegible]

- 5 -

大崎市

1 次单価表

単価使用年月	2025.12
歩掛適用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 1号	掘削	土質:土砂,施工方法:オープンカット,押土:無し,障害:無し,施工数量:5,000m3未満	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削		土砂,オープンカット,無し,無し,5,000m3未満						
			m3	1				
合計								
単価							円/m3	

1 次单価表

單価使用年月	2025. 12
歩掛適用年月	2025. 12
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 2号	土砂等運搬	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準,ﾊﾞｯｸｵﾌ山積0.8m3(平積0.6m3), 土砂(岩塊・玉石混り土含む),有り,1 9.5km以下						
			m3	1				
合計								
単価							円／m3	

- 6 -

大崎市

1 次単価表

						単価使用年月	2025. 12
						歩掛適用年月	2025. 12
						労務調整係数	1.000-00000 0.0 0
単 3号	残土等処分		単位	m3	単位数量	1	単価
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要
残土等処分			m3	1			
合計							
単価							円／m3

1 次単価表

						単価使用年月	2025. 12
						歩掛適用年月	2025. 12
						労務調整係数	1.000-00000 0.0 0
単 4号	安定処理	混合深さ:0.6m以下, 固化材100m2あたり使用量:7.33t/100m2, 固化材の種類:一般軟弱土用	単位	m2	単位数量	1	単価
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要
安定処理		スラベラ付, 0.6m以下, 7.33t/100m2, 1回	m2	1			
合計							
単価							円／m2

- 7 -

大崎市

1 次単価表

						単価使用年月	2025. 12
						歩掛適用年月	2025. 12
						労務調整係数	1.000-00000 0.0 0
単 5号	床掘り	土質:土砂	単位	m3	単位数量	1	単価
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要
床掘り		土砂, 標準, 無し, 無し	m3	1			
合計							
単価							円／m3

1 次単価表

						単価使用年月	2025. 12
						歩掛適用年月	2025. 12
						労務調整係数	1.000-00000 0.0 0
単 6号	埋戻し	土質:土砂	単位	m3	単位数量	1	単価
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要
埋戻し		最大埋戻幅1m未満	m3	1			
合計							
単価							円／m3

- 8 -

大崎市

1 次単価表

						単価使用年月	2025. 12
						歩掛適用年月	2025. 12
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0
単 7号	自由勾配側溝	側溝規格:300 X 400	単位	m	単位数量	1	単価
名称・規格			単位	数量	単価	金額	摘要
自由勾配側溝							単 23号
			m	1			
合計							
単価							円／m

1 次単価表

						単価使用年月	2025. 12
						歩掛適用年月	2025. 12
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0
単 8号	自由勾配側溝	側溝規格:300 X 500	単位	m	単位数量	1	単価
名称・規格			単位	数量	単価	金額	摘要
自由勾配側溝							単 24号
			m	1			
合計							
単価							円／m

1 次単価表

						単価使用年月	2025. 12
						歩掛適用年月	2025. 12
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0
単 9号	側溝蓋	Co製 軽荷重用	単位	枚	単位数量	1	単価
名称・規格			単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版							単 25号
			枚	1			
合計							
単価							円／枚

1 次単価表

						単価使用年月	2025. 12
						歩掛適用年月	2025. 12
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0
単 10号	側溝蓋	銅製Gr製細目 軽荷重用	単位	枚	単位数量	1	単価
名称・規格			単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版							単 26号
			枚	1			
合計							
単価							円／枚

1 次単価表						単価使用年月		2025. 12	
						歩掛適用年月		2025. 12	
						労務調整係数		1.000-00000 0.0 0	
単 11号	プレキャスト街渠樹	樹規格:路面排水樹	単位	箇所	単位数量	1	単価		
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
プレキャスト集水樹		据付, 200kgを超え400kg以下, 有り, 全ての費用							
			基	1					
プレキャスト集水樹(材料費)									
			基	1					
硬質塩化ビニル管(薄肉管) VU-150									
			m	3.12					
歩車道境界ブロック (両面R) C-180/240×300×2000									
			個	0.33					
合計									
単価							円／箇所		

1 次単価表						単価使用年月		2025. 12	
						歩掛適用年月		2025. 12	
						労務調整係数		1.000-00000 0.0 0	
単 12号	下層路盤(車道・路肩部)	路盤材種類:再生クラッシュラン RC-40, 仕上り厚:710mm	単位	m2	単位数量	1	単価		
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
下層路盤(車道・路肩部)		710mm, 4層施工, 再生クラッシュラン RC-40, 全ての費用							
			m2	1					
合計									
単価							円／m2		

1 次単価表						単価使用年月		2025. 12	
						歩掛適用年月		2025. 12	
						労務調整係数		1.000-00000 0.0 0	
単 13号	下層路盤(歩道部)	路盤材種類:再生クラッシュラン RC-40, 仕上り厚:100mm	単位	m2	単位数量	1	単価		
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
下層路盤(歩道部)		100mm, 1層施工, 再生クラッシュラン RC-40, 全ての費用							
			m2	1					
合計									
単価							円／m2		

1 次単価表						単価使用年月		2025. 12	
						歩掛適用年月		2025. 12	
						労務調整係数		1.000-00000 0.0 0	
単 14号	下層路盤(歩道部)	路盤材種類:再生クラッシュラン RC-40, 仕上り厚:250mm	単位	m2	単位数量	1	単価		
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
下層路盤(歩道部)		250mm, 2層施工, 再生クラッシュラン RC-40, 全ての費用							
			m2	1					
合計									
単価							円／m2		

1 次単価表						単価使用年月		2025. 12	
						歩掛適用年月		2025. 12	
						労務調整係数		1.000-00000 0.0 0	
単 15号	フィルター層	材料種類:砂, 仕上り厚:50mm	単位	m2	単位数量	1	単価		
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
フィルター層		40mm以上60mm未満							
			m2	1					
合計									
単価							円／m2		

1 次単価表						単価使用年月		2025. 12	
						歩掛適用年月		2025. 12	
						労務調整係数		1.000-00000 0.0 0	
単 16号	管(函)渠型側溝	幅:30cm, 高さ:30cm	単位	m	単位数量	1	単価		
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
管(函)渠型側溝		据付, 200mm以上300mm以下, 有り, 全ての費用							
			m	1					
合計									
単価							円／m		

1 次単価表						単価使用年月		2025. 12	
						歩掛適用年月		2025. 12	
						労務調整係数		1.000-00000 0.0 0	
単 17号	プレキャストU型側溝	U型側溝規格:L型側溝 (一般部) LS3-1 L=2000	単位	m	単位数量	1	単価		
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
U型側溝		据付け, 無し, 無し, 側溝(各種), L=2000mm, 1000kg/個以下, 無し, 無し, 無し					単 27号		
			m	1					
合計									
単価							円/m		

1 次単価表						単価使用年月	2025. 12
						歩掛適用年月	2025. 12
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0
単 18号	プレキャストU型側溝	U型側溝規格:L型側溝（乗入部）LS3-1 L=2000	単位	m	単位数量	1	単価
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝		据付け, 無し, 無し, 側溝(各種), L=2000mm, 1000kg/個以下, 無し, 無し, 無し	m	1			単 28号
合計							
単価							円/m

1 次単価表						単価使用年月	2025. 12
						歩掛適用年月	2025. 12
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0
単 19号	歩車道境界ﾌﾟﾛｯｸ	ﾌﾟﾛｯｸ規格:C-180/240X300X2000	単位	m	単位数量	1	単価
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要
歩車道境界ﾌﾟﾛｯｸ		設置, 各種1000-2000mm, 150-550kg未満, 0. 5個/m, 無し, 無し	m	1			
合計							
単価							円/m

1 次単価表						単価使用年月	2025. 12
						歩掛適用年月	2025. 12
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0
単 20号	建設機械運搬費		単位	台	単位数量	1	単価
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要
貨物自動車による運搬(1車1回)		ｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞ(路床改良用)D0. 6mW2. 0m, 44km, 有, 有	台	1			単 29号
合計							
単価							円/台

1 次単価表						単価使用年月	2025. 12
						歩掛適用年月	2025. 12
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0
単 21号	CBR試験		単位	試料	単位数量	1	単価
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要
室内CBR試験用試料採取 締め固める土（70kg）			箇所	1			
CBR試験 締め固めた土のCBR試験 設計CBR モｰﾙﾄﾞ2個使用			試料	1			
合計							
単価							円/試料

1 次単価表

						単価使用年月	2025. 12	
						歩掛適用年月	2025. 12	
						労務調整係数	1.000-00000 0.0 0	
単 22号	六価クロム溶出試験		単位	検体	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
六価クロム溶出試験			検体	1				
合計								
単価							円／検体	

2 次単価表

						単価使用年月	2025. 12	
						歩掛適用年月	2025. 12	
						労務調整係数	1.000-00000 0.0 0	
単 23号	自由勾配側溝	無し, L=2000mm 1000kg/個以下, 無し, 生コンクリート(各種), 0.26m3/10m, 有り, 再生クラッシュヤーン 40〜0, 0.51m3/10m, 生コ	単位	m	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
自由勾配側溝 昼間 L2000 1000kg以下 制約無			m	10				
側溝 自由勾配側溝 300 X 400 X 2000			個	5				
生コンクリート 18-8-40-60%			m3	0.276				
生コンクリート 18-8-40-60%			m3	0.159				
再生クラッシュヤーン RC-40			m3	0.612				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／m	

2次単価表

単価使用年月	2025. 12
歩掛適用年月	2025. 12
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 24号	自由勾配側溝	無し, L=2000mm 1000kg/個以下, 無し, 生コンクリート(各種), 0.26m3/10m, 有り, 再生クラッシャーレン 40〜0, 0.51m3/10m, 生コ	単位	m	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
自由勾配側溝 昼間 L2000 1000kg以下 制約無			m	10				
側溝 自由勾配側溝 300X500X2000			個	5				
生コンクリート 18-8-40-60%			m3	0.276				
生コンクリート 18-8-40-60%			m3	0.159				
再生クラッシャーレン RC-40			m3	0.612				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円/㎡	

2次単価表

単価使用年月	2025. 12
歩掛適用年月	2025. 12
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 25号	蓋版	据付け, 無し, 蓋版(各種), 40kg/枚以下, 無し, 無し	単位	枚	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版コンクリート・鋼製 昼間 40kg以下 制約無			枚	100				
側溝蓋 自由勾配側溝蓋 300用(軽荷重用)			枚	100				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円/枚	

2次単価表

						単価使用年月	2025. 12	
						歩掛適用年月	2025. 12	
						労務調整係数	1.000-00000	0.0 0
単 26号	蓋版	据付け,無し,蓋版(各種),40kg/枚以下,無し,無し	単位	枚	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版コンクリート・鋼製 昼間 40kg以下 制約無			枚	100				
側溝蓋 自由勾配側溝蓋 300用 (軽荷重用 鋼製Gr)			枚	100				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円/枚	

2次単価表

						単価使用年月	2025. 12	
						歩掛適用年月	2025. 12	
						労務調整係数	1.000-00000	0.0 0
単 27号	U型側溝	据付け,無し,無し,側溝(各種),L=2000mm,1000kg/個以下,無し,無し,無し	単位	m	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝 昼間 L2000 1000kg以下 制約無			m	10				
側溝 L型側溝 LS3-1 L=2000 (一般部)			個	5				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円/m	

單僱使用年月	2025. 12
步掛適用年月	2025. 12
勞務調整係數	1.000-00000 0.0 0

- 23 - 大崎市

單僱使用年月	2025. 12
步掛適用年月	2025. 12
勞務調整係數	1.000-00000 0.0 0

- 24 - 大崎市

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	都市計画道路李埵新田線（Ⅱ期）道路改良工事（2工区）			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
道路改良 (0001)	式	1			
道路土工 (0002)	式	1			
掘削工 (0003)	式	1			
掘削 (0004) (P)	m3	620			第0001号単価表 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2025.12 単 2025.12 単価地区 大崎市（旧古川市） 労調係数 1.000 00-00 0
Q01 土質 Q02 施工方法 Q03 押土 Q04 障害 Q05 施工数量 Q06 掘削費		土砂 オープンカット 無し 無し 5,000m3未満 掘削			週休2日補正 補正なし
掘削	m3	1			CB210100 管理費区分 0 歩 2025.12 単 2025.12 単価地区 大崎市（旧古川市） 労調係数 1.000 00-00 0
J01 土質 J02 施工方法 J03 押土の有無 J04 障害の有無 J05 施工数量		土砂 オープンカット 無し 無し 5,000m3未満			単価補正
残土処理工 (0005)	式	1			
土砂等運搬 (0006) (P)	m3	620			第0002号単価表 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2025.12 単 2025.12
Q01 土砂等発生現場		標準			

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

- 25 -

大崎市

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	都市計画道路李埵新田線（Ⅱ期）道路改良工事（2工区）			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
Q02 土質 Q03 運搬費		土砂(岩塊・玉石混り土含む) 土砂等運搬			単価地区 大崎市（旧古川市） 労調係数 1.000 00-00 0
土砂等運搬	m3	1			週休2日補正 補正なし
J01 土砂等発生現場 J02 積込機種・規格 J03 土質 J04 DID区間の有無 J06 運搬距離(km) (DID区間有)		標準 バックホう山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 19.5km以下			CB210110 管理費区分 0 歩 2025.12 単 2025.12 単価地区 大崎市（旧古川市） 労調係数 1.000 00-00 0
残土等処分 (0007) (P)	m3	620			単価補正
Q01 処分費		残土等処分			第0003号単価表 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2025.12 単 2025.12 単価地区 大崎市（旧古川市） 労調係数 1.000 00-00 0
残土等処分	m3	1			週休2日補正 補正なし
地盤改良工 (0008)	式	1			CB210560 管理費区分 0 歩 2025.12 単 2025.12 単価地区 大崎市（旧古川市） 労調係数 1.000 00-00 0
					単価補正

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

- 26 -

大崎市

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	都市計画道路李埜新田線（Ⅱ期）道路改良工事（2工区）			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
路床安定処理工 (0009)	式	1			
安定処理 (0010) (P)	m2	536			第0004号単価表 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2025.12 単 2025.12 単価地区 大崎市（旧古川市） 労調係数 1.000 00-00 0
Q01 施工機種		スグレライザ（標準）			
Q03 混合深さ		0.6m以下			
Q04 固化材100m2あたり使用量		7.33t/100m2			
Q05 固化材の種類		一般軟弱土用			
Q06 安定処理費		安定処理			
安定処理	m2	1			週休2日補正 補正なし
J01 使用機種		スグレライザ			
J03 混合深さ		0.6m以下			
J04 固化材100m2当り使用量(実数)		7.33t/100m2			
J05 混合回数		1回			
排水構造物工 (0011)	式	1			単価補正
作業土工 (0012)	式	1			
床掘り (0013) (P)	m3	20			第0005号単価表 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2025.12 単 2025.12 単価地区 大崎市（旧古川市） 労調係数 1.000 00-00 0
Q01 土質		土砂			
Q02 掘削費		床掘り			

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

- 27 -

大崎市

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	都市計画道路李埜新田線（Ⅱ期）道路改良工事（2工区）			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
床掘り	m3	1			週休2日補正 補正なし
J01 土質		土砂			
J02 施工方法		標準			
J03 土留方式の種類		無し			
J04 障害の有無		無し			
埋戻し (0014) (P)	m3	10			第0006号単価表 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2025.12 単 2025.12 単価地区 大崎市（旧古川市） 労調係数 1.000 00-00 0
Q01 施工方法		最大埋戻幅1m未満			
Q03 土質		土砂			
Q04 埋戻し費		埋戻し			
埋戻し	m3	1			週休2日補正 補正なし
J01 施工方法		最大埋戻幅1m未満			
側溝工 (0015)	式	1			単価補正
自由勾配側溝 (0016)	m	25.7			第0007号単価表 単位数量 1 m 管理費区分 0

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

- 28 -

大崎市

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	都市計画道路李埵新田線(Ⅱ期)道路改良工事(2工区)			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
Q01 側溝規格 Q02 自由勾配側溝設置費		300X400 自由勾配側溝			歩 2025.12 単 2025.12 単価地区 大崎市(旧古川市) 労調係数 1.000 00-00 0
自由勾配側溝	m	1			週休2日補正 補正なし
J01 夜間作業の有無 J02 規格・仕様区分 J03 時間的制約の有無 J04 基礎コンクリートの種類 J05 基礎コンクリート設計数量(実数入力) J06 基礎碎石施工の有無 J07 基礎碎石の種類 J08 基礎碎石設計数量(実数入力) J09 底部コンクリートの種類 J10 底部コンクリート設計数量(実数入力)		無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し 生コンクリート(各種) 0.26m3/10m 有り 再生クラッシュラン 40～0 0.51m3/10m 生コンクリート(各種) 0.15m3/10m			WB821420 管理費区分 0 歩 2025.12 単 2025.12 単価地区 大崎市(旧古川市) 労調係数 1.000 00-00 0
自由勾配側溝 (0017)	m	13.5			単価補正
Q01 側溝規格 Q02 自由勾配側溝設置費		300X500 自由勾配側溝			第0008号単価表 単位数量 1 m 管理費区分 0 歩 2025.12 単 2025.12 単価地区 大崎市(旧古川市) 労調係数 1.000 00-00 0
自由勾配側溝	m	1			週休2日補正 補正なし
J01 夜間作業の有無 J02 規格・仕様区分 J03 時間的制約の有無 J04 基礎コンクリートの種類		無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し 生コンクリート(各種)			WB821420 管理費区分 0 歩 2025.12 単 2025.12 単価地区 大崎市(旧古川市) 労調係数 1.000 00-00 0

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 29 - 大崎市

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	都市計画道路李埵新田線(Ⅱ期)道路改良工事(2工区)			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
J05 基礎コンクリート設計数量(実数入力) J06 基礎碎石施工の有無 J07 基礎碎石の種類 J08 基礎碎石設計数量(実数入力) J09 底部コンクリートの種類 J10 底部コンクリート設計数量(実数入力)		0.26m3/10m 有り 再生クラッシュラン 40～0 0.51m3/10m 生コンクリート(各種) 0.15m3/10m			単価補正
側溝蓋 (0018)	枚	16			第0009号単価表 単位数量 1 枚 管理費区分 0 歩 2025.12 単 2025.12 単価地区 大崎市(旧古川市) 労調係数 1.000 00-00 0
Q01 蓋種類 Q03 蓋版設置費		蓋版(各種) 蓋版			週休2日補正 補正なし
蓋版	枚	1			WB821430 管理費区分 0 歩 2025.12 単 2025.12 単価地区 大崎市(旧古川市) 労調係数 1.000 00-00 0
J01 作業区分 J02 夜間作業の有無 J03 蓋版の種類 J05 規格・仕様区分 J06 時間的制約の有無 J07 施工箇所における補正		据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し			単価補正
側溝蓋 (0019)	枚	3			オプション入力 第0010号単価表 単位数量 1 枚 管理費区分 0 歩 2025.12 単 2025.12 単価地区 大崎市(旧古川市) 労調係数 1.000 00-00 0
					週休2日補正 補正なし

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 30 - 大崎市

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	都市計画道路李埵新田線(Ⅱ期)道路改良工事(2工区)			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
蓋版	枚	1			WB821430 管理費区分 0 歩 2025.12 単 2025.12 単価地区 大崎市(旧古川市) 労調係数 1.000 00-00 0
J01 作業区分		据付け			
J02 夜間作業の有無		無し			
J03 蓋版の種類		蓋版(各種)			
J05 規格・仕様区分		40kg/枚以下			
J06 時間的制約の有無		無し			
J07 施工箇所における補正		無し			単価補正
集水樹・マンホール工 (0020)	式	1			
プレキャスト街渠樹 (0021)	箇所	3			オプション入力 第0011号単価表 単位数量 1 箇所 管理費区分 0 歩 2025.12 単 2025.12 単価地区 大崎市(旧古川市) 労調係数 1.000 00-00 0
					週休2日補正 補正なし
プレキャスト集水樹	基	1			CB222800 管理費区分 0 歩 2025.12 単 2025.12 単価地区 大崎市(旧古川市) 労調係数 1.000 00-00 0
J01 作業区分		据付			
J02 製品質量(kg/基)		200kgを超え400kg以下			
J03 基礎碎石の有無		有り			
J04 費用の内訳		全ての費用			
					単価補正
プレキャスト集水樹(材料費)	基	1			CB222810 管理費区分 0 歩 2025.12 単 2025.12 単価地区 大崎市(旧古川市)

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 31 - 大崎市

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	都市計画道路李埵新田線(Ⅱ期)道路改良工事(2工区)			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					労調係数 1.000 00-00 0
					単価補正
硬質塩化ビニル管(薄肉管) VU-150	m	3.12			Z005002018 管理費区分 0 歩 2025.12 単 2025.12 単価地区 大崎市(旧古川市) 労調係数 1.000 00-00 0
					単価補正
歩車道境界ブロック(両面R) C-180/240×300×2000	個	0.33			ZM05080080 管理費区分 0 歩 2025.12 単 2025.12 単価地区 大崎市(旧古川市) 労調係数 1.000 00-00 0
					単価補正
舗装 (0022)	式	1			
舗装工 (0023)	式	1			
アスファルト舗装工 (0024)	式	1			
下層路盤(車道・路肩部) (0025)(P)	m2	495			第0012号単価表 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2025.12 単 2025.12
Q01 路盤材種類		再生クワッチャン RC-40			

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 32 - 大崎市

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	都市計画道路李埤新田線(Ⅱ期)道路改良工事(2工区)			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
Q03 仕上り厚 Q04 路盤材数均し・締固め費		710mm 下層路盤(車道・路肩部)			単価地区 大崎市(旧古川市) 労調係数 1.000 00-00 0
下層路盤(車道・路肩部)	m2	1			週休2日補正 補正なし
J01 全仕上り厚(実数入力) J02 施工区分 J03 材料 J04 費用の内訳		710mm 4層施工 再生クワッチャン RC-40 全ての費用			CB410030 管理費区分 0 歩 2025.12 単 2025.12 単価地区 大崎市(旧古川市) 労調係数 1.000 00-00 0
下層路盤(歩道部) (0026)(P)	m2	351			単価補正 第0013号単価表 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2025.12 単 2025.12 単価地区 大崎市(旧古川市) 労調係数 1.000 00-00 0
Q01 路盤材種類 Q03 仕上り厚 Q04 路盤材数均し・締固め費		再生クワッチャン RC-40 100mm 下層路盤(歩道部)			週休2日補正 補正なし
下層路盤(歩道部)	m2	1			CB410031 管理費区分 0 歩 2025.12 単 2025.12 単価地区 大崎市(旧古川市) 労調係数 1.000 00-00 0
J01 全仕上り厚(実数入力) J02 施工区分 J03 材料 J04 費用の内訳		100mm 1層施工 再生クワッチャン RC-40 全ての費用			単価補正 第0014号単価表 単位数量 1 m2 管理費区分 0
下層路盤(歩道部) (0027)(P)	m2	34			

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

- 33 -

大崎市

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	都市計画道路李埤新田線(Ⅱ期)道路改良工事(2工区)			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
Q01 路盤材種類 Q03 仕上り厚 Q04 路盤材数均し・締固め費		再生クワッチャン RC-40 250mm 下層路盤(歩道部)			歩 2025.12 単 2025.12 単価地区 大崎市(旧古川市) 労調係数 1.000 00-00 0
下層路盤(歩道部)	m2	1			週休2日補正 補正なし
J01 全仕上り厚(実数入力) J02 施工区分 J03 材料 J04 費用の内訳		250mm 2層施工 再生クワッチャン RC-40 全ての費用			CB410031 管理費区分 0 歩 2025.12 単 2025.12 単価地区 大崎市(旧古川市) 労調係数 1.000 00-00 0
透水性舗装工 (0028)	式	1			単価補正
フィルター層 (0029)(P)	m2	351			第0015号単価表 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2025.12 単 2025.12 単価地区 大崎市(旧古川市) 労調係数 1.000 00-00 0
Q01 材料種類 Q02 仕上り厚 Q03 フィルター層敷設費		砂 50mm フィルター層			週休2日補正 補正なし
フィルター層	m2	1			CB410650 管理費区分 0 歩 2025.12 単 2025.12 単価地区 大崎市(旧古川市) 労調係数 1.000 00-00 0
J01 平均厚さ		40mm以上60mm未満			

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

- 34 -

大崎市

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	都市計画道路李埵新田線（Ⅱ期）道路改良工事（2工区）			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
排水構造物工 (0030)	式	1			単価補正
側溝工 (0031)	式	1			
管(函)渠型側溝 (0032) (P)	m	70			第0016号単価表 単位数量 1 m 管理費区分 0 歩 2025.12 単 2025.12 単価地区 大崎市（旧古川市） 労調係数 1.000 00-00 0 週休2日補正 補正なし
Q01 幅 Q02 高さ Q03 管(函)渠型側溝設置費		30cm 30cm 管(函)渠型側溝			
管(函)渠型側溝	m	1			CB222790 管理費区分 0 歩 2025.12 単 2025.12 単価地区 大崎市（旧古川市） 労調係数 1.000 00-00 0 単価補正
J01 作業区分 J02 内径又は内空幅(mm) J03 基礎碎石の有無 J04 費用の内訳		据付 200mm以上300mm以下 有り 全ての費用			
プレキャストU型側溝 (0033)	m	28			第0017号単価表 単位数量 1 m 管理費区分 0 歩 2025.12 単 2025.12 単価地区 大崎市（旧古川市） 労調係数 1.000 00-00 0 週休2日補正 補正なし
Q01 U型側溝規格 Q02 U型側溝設置費		L型側溝（一般部）LS3-1 L=2000 U型側溝			

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

- 35 -

大崎市

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	都市計画道路李埵新田線（Ⅱ期）道路改良工事（2工区）			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
U型側溝	m	1			WB821410 管理費区分 0 歩 2025.12 単 2025.12 単価地区 大崎市（旧古川市） 労調係数 1.000 00-00 0 単価補正
J01 作業区分 J02 L=1000・L=4000の使用の有無 J03 夜間作業の有無 J04 U型側溝の種類 J06 U型側溝の規格・仕様 J07 U型側溝の質量 J08 時間的制約の有無 J09 施工箇所における補正 J10 基礎碎石施工の有無		据付け 無し 無し 側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下 無し 無し 無し			
プレキャストU型側溝 (0034)	m	12			第0018号単価表 単位数量 1 m 管理費区分 0 歩 2025.12 単 2025.12 単価地区 大崎市（旧古川市） 労調係数 1.000 00-00 0 週休2日補正 補正なし
Q01 U型側溝規格 Q02 U型側溝設置費		L型側溝（乗入部）LS3-1 L=2000 U型側溝			
U型側溝	m	1			WB821410 管理費区分 0 歩 2025.12 単 2025.12 単価地区 大崎市（旧古川市） 労調係数 1.000 00-00 0 単価補正
J01 作業区分 J02 L=1000・L=4000の使用の有無 J03 夜間作業の有無 J04 U型側溝の種類 J06 U型側溝の規格・仕様 J07 U型側溝の質量 J08 時間的制約の有無 J09 施工箇所における補正 J10 基礎碎石施工の有無		据付け 無し 無し 側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下 無し 無し 無し			
縁石工 (0035)	式	1			

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

- 36 -

大崎市

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	都市計画道路李埵新田線(Ⅱ期)道路改良工事(2工区)			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
縁石工 (0036)	式	1			
歩車道境界ﾌﾟﾛｯｸ (0037) (P)	m	70			第0019号単価表 単位数量 1 m 管理費区分 0 歩 2025.12 単 2025.12 単価地区 大崎市(旧古川市) 労調係数 1.000 00-00 0
Q01 ﾌﾟﾛｯｸ規格 Q03 ﾌﾟﾛｯｸ規格 Q04 歩車道境界ﾌﾟﾛｯｸ費		各種(1000mm超2000mm以下、150kg以上550kg未満) C-180/240X300X2000 歩車道境界ﾌﾟﾛｯｸ			週休2日補正 補正なし
歩車道境界ﾌﾟﾛｯｸ	m	1			CB422510 管理費区分 0 歩 2025.12 単 2025.12 単価地区 大崎市(旧古川市) 労調係数 1.000 00-00 0
J01 作業区分 J02 ﾌﾟﾛｯｸ規格 J03 m当り歩車道境界ﾌﾟﾛｯｸ使用量 J04 基礎碎石規格 J05 均し基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ規格		設置 各種1000-2000mm、150-550kg未満 0.5個/m 無し 無し			単価補正
直接工事費 (0038)	式	1			
共通仮設 (0039)	式	1			
共通仮設費 (0040)	式	1			
運搬費 (0041)	式	1			

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

- 37 -

大崎市

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	都市計画道路李埵新田線(Ⅱ期)道路改良工事(2工区)			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
建設機械運搬費 (0042)	台	2			第0020号単価表 単位数量 1 台 管理費区分 0 歩 2025.12 単 2025.12 単価地区 大崎市(旧古川市) 労調係数 1.000 00-00 0
Q01 貨物自動車による運搬費		貨物自動車による運搬(1車1回)			週休2日補正 補正なし
貨物自動車による運搬(1車1回)	台	1			WB010010 管理費区分 0 歩 2025.12 単 2025.12 単価地区 大崎市(旧古川市) 労調係数 1.000 00-00 0
J01 運搬区分 J02 片道運搬距離(実数入力) J03 その他の諸料金の有無 J04 その他の諸料金M(実数入力) J05 運搬中の賃料(損料)の有無 J06 運搬中の賃料(損料)K(K') (実数)		ｽﾀﾋﾞﾗｲｻﾞ(路床改良用)D0.6mW2.0m 44km 有 有			単価補正
技術管理費 (0043)	式	1			
CBR試験 (0044)	試料	3			オプション入力 第0021号単価表 単位数量 1 試料 管理費区分 0 歩 2025.12 単 2025.12 単価地区 大崎市(旧古川市) 労調係数 1.000 00-00 0
室内CBR試験用試料採取 締め固める土(70kg)	箇所	1			週休2日補正 補正なし オプション入力 管理費区分 0 歩 2025.12 単 2025.12

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

- 38 -

大崎市

【参考資料】 積算入力データリスト (本01)

工事名	都市計画道路李埴新田線(Ⅱ期)道路改良工事 (2工区)			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					単価地区 大崎市 (旧古川市) 労調係数 1.000 00-00 0 単価補正
CBR試験 締め固めた土のCBR試験 設計CBR モーメント2個使用	試料	1			ZM23000001 管理費区分 0 歩 2025.12 単 2025.12 単価地区 大崎市 (旧古川市) 労調係数 1.000 00-00 0 単価補正
六価クロム溶出試験 (0045)	検体	1			オプション入力 第0022号単価表 単位数量 1 検体 管理費区分 9 歩 2025.12 単 2025.12 単価地区 大崎市 (旧古川市) 労調係数 1.000 00-00 0 週休2日補正 補正なし
六価クロム溶出試験	検体	1			ZM97903010 管理費区分 0 歩 2025.12 単 2025.12 単価地区 大崎市 (旧古川市) 労調係数 1.000 00-00 0 単価補正
共通仮設費 (率計上) (0046)	式	1			

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

- 39 -

大崎市

【参考資料】 積算入力データリスト (本01)

工事名	都市計画道路李埤新田線(Ⅱ期)道路改良工事 (2工区)			事業区分	道路新設・改築	
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
主たる工種 施工地域等補正 除雪工事補正 ICT施工補正 週休2日補正 復興係数補正 実績変更対象費 (積上げ)		04:道路改良工事 補正無し (地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合) 未使用 補正なし 補正なし あり			1.0 1.00 1.0 1.00 1.3	
純工事費 (0047)		式	1			
現場管理費 (0048)		式	1			
施工地域等補正 工期日数 (熱中症補正) 真夏日日数 補正係数 熱中症補正 工期日数 冬期日数 積雪寒冷地区分 施工時期補正 緊急工事補正 砂防・地滑り補正 ICT施工補正 週休2日補正 復興係数補正 実績変更対象費 (積上げ)		補正無し (地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合) 0日間 0日間 補正なし 自動設定 0日間 0日間 補正なし 自動設定 補正なし 補正なし 補正なし 1.0 補正なし あり			1.0 0.00 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 1.0 1.00 1.1	
工事原価 (0049)		式	1			
一般管理費等 (0050)		式	1			
前払金支出割合による補正		補正を行わない			1.00	

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

- 40 -

大崎市

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	都市計画道路李埴新田線(Ⅱ期)道路改良工事(2工区)			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
財団法人等による補正 契約保証に係る補正率	補正を行わない 金銭的保証		1.00 0.04%		
工事価格 (0051)	式	1			
消費税額及び地方消費税額 (0052)	式	1			
工事費計 (0053)	式	1			
